Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis avant réalisation de travaux

(Liste C de l'annexe 13-9 du code de la santé publique)



Désignation du ou des bâtiments	Désignation du propriétaire
Localisation du ou des bâtiments : Département : ... **Hauts-de-Seine** Adresse : ..... **Résidence Les Champs Phillipe** **15-17 Avenue de Verdun** Commune : ..... **92250 LA GARENNE COLOMBES** Désignation et situation du ou des lots : **, Lot numéro Non communiqué** Périmètre de repérage : **Sous-station ECS**	*Désignation du client :* Nom et prénom : ... **Haut de Seine Habitat - OPH** Adresse : ..... **45 Rue Paul-Vaillant Couturier** **92532 LEVALLOIS PERRET CEDEX**

Prestations	Conclusion
repérage amiante avant travaux	**Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.**

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis avant réalisation de travaux

Numéro de dossier : RAAT_0103500001_LA GARENNE COLOMBES
Date du repérage : 05/02/2025

Références réglementaires et normatives	
Textes réglementaires	La mission est effectuée en application de l'article L4412-2 du Code du Travail, décret n° 2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations, arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis.
Norme(s) utilisée(s)	Norme NF X 46-020 d'Août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis

Immeuble bâti visité	
Adresse	Rue : ..... **Résidence Les Champs Phillipe** **15-17 Avenue de Verdun** Bât., escalier, niveau, appartement n°, lot n°: **, Lot numéro Non communiqué** Code postal, ville : . **92250 LA GARENNE COLOMBES**
Périmètre de repérage :	..... **Sous-station ECS**
Type de logement : Fonction principale du bâtiment : Date de construction :	.... **Etablissements sociaux** ..... **Date du permis de construire non connue**

Le propriétaire et le donneur d'ordre	
Le(s) propriétaire(s) :	Nom et prénom **:** ... **Haut de Seine Habitat - OPH** Adresse : ..... **45 Rue Paul-Vaillant Couturier** **92532 LEVALLOIS PERRET CEDEX**
Le donneur d'ordre	Nom et prénom : ... **Haut de Seine Habitat - OPH de Nanterre** Adresse : ..... **134 Rue Salvador Allende** **92000 NANTERRE**

Le(s) signataire(s)

	NOM Prénom	Fonction	Organisme certification	Détail de la certification
Opérateur(s) de repérage ayant participé au repérage ---------- Personne(s) signataire(s) autorisant la diffusion du rapport	DJIAN Michael	Opérateur de repérage	SOCOTEC Certification France 11-13 Cours Valmy Tour Pacific 92977 PARIS LA DEFENSE CEDEX	Obtention : 08/03/2021 Échéance : 07/03/2028 N° de certification : DTI / 2103-002

Raison sociale de l'entreprise : **PYRAMIDE CONSEILS** (Numéro SIRET : **842 113 110 000 22)**
Adresse : **1 rue Louis Armand, 95230 Soisy sous Montmorency**
Désignation de la compagnie d'assurance : **Allianz**
Numéro de police et date de validité : **86517808 / 808109147 / 30/09/2025**

Le rapport de repérage
Date d'émission du rapport de repérage : 11/02/2025, remis au propriétaire le 11/02/2025
Diffusion : le présent rapport de repérage ne peut être reproduit que dans sa totalité, annexes incluses
Pagination : le présent rapport avec les annexes comprises, est constitué de 30 pages

Sommaire

1 Les conclusions
2 Le(s) laboratoire(s) d'analyses
3 La mission de repérage
3.1 L'objet de la mission
3.2 Le cadre de la mission
3.2.1 L'intitulé de la mission
3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission
3.2.3 L'objectif de la mission
3.2.4 Le programme de repérage de la mission réglementaire.
3.2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas échéant)
3.2.6 Le périmètre de repérage effectif
4 Conditions de réalisation du repérage
4.1 Bilan de l'analyse documentaire
4.2 Date d'exécution des visites du repérage in situ
4.3 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur
4.4 Plan et procédures de prélèvements
4.5 Réserves
5 Conclusion détaillé du repérage
5.1 Liste des produits et matériaux présentées par catégorie
5.2 Récapitulatif zone par zone
6 Signatures
7 Annexes

1. – Les conclusions

1.1. Dans le cadre de mission décrit à l'article 3.2, il a été repéré :

- des matériaux et produits contenant de l'amiante après analyse en laboratoire :

Enduit mur (S-1 - Sous-station) pour lequel il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.*
Joint de bride (S-1 - Sous-station) pour lequel il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.*
Joint de bride (S-1 - Sous-station) pour lequel il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.*

L'ensemble des joints de bride de la sous-station sont considérés amiantés

- des matériaux et produits ayant fait l'objet d'analyse, ne contenant pas d'amiante :

Ragréage (S-1 - Sous-station)
Isolant plafond (S-1 - Sous-station)
Calorifuge (S-1 - Sous-station)
Calorifuge (S-1 - Sous-station)
Calorifugeage (S-1 - Sous-station)
Joint de dilatation (S-1 - Sous-station)
Joint tresse (S-1 - Sous-station)

*** Un détail des conséquences réglementaires et recommandations est fourni en annexe de ce rapport, il est rappelé la nécessité d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux et produits concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.**

1.2. Dans le cadre de mission décrit à l'article 3.2 les locaux ou parties de locaux, composants ou parties de composants qui n'ont pu être visités et pour lesquels des investigations approfondies sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou l'absence d'amiante :

Localisation	Parties du local	Raison
S-1 - Plafond sous-station	Toutes	Recouvert d'isolant (visite partielle)

Certains locaux, parties de locaux ou composants n'ont pas pu être sondés, des investigations approfondies doivent être réalisées afin d'y vérifier la présence éventuelle d'amiante. Les obligations règlementaires du (des) propriétaire(s) prévues aux articles R.1334-15 à R.1334-18 du Code de la Santé Publique, ne sont pas remplies conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 12 Décembre 2012 (Listes "A" et "B")

2. – Le(s) laboratoire(s) d'analyses

Raison sociale et nom de l'entreprise : ...LAB EXPERT SAS
Adresse : .....128 BIS AVENUE JEAN JAURES 94200 IVRY SUR SEINE
Numéro de l'accréditation Cofrac :.....1 - 6752 / 848 416 806 00018

3. – La mission de repérage

3.1 L'objet de la mission

Dans le cadre de la réalisation de travaux dans l'immeuble bâti, ou de la partie d'immeuble bâti, décrit en page de couverture du présent rapport, la mission consiste à repérer dans cet immeuble, ou partie d'immeuble, les matériaux ou produits contenant de l'amiante.

3.2 Le cadre de la mission

3.2.1 L'intitulé de la mission

«Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux».

3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission

La mission est effectuée en application de l'article L4412-2 du Code du Travail, décret n° 2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations, arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis.

3.2.3 L'objectif de la mission

«Le repérage a pour objectif d'identifier et de localiser tous les matériaux et produits contenant de l'amiante situés dans la zone impactée par les travaux.»
Des listes de matériaux pouvant contenir de l'amiante sont définies de façon non exhaustive dans l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019.

3.2.4 Le programme de repérage

Le programme de repérage est défini par l'arrêté du 16 juillet 2019 modifié et de son annexe 1.

1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités	Plaques ondulées et planes
	Ardoises, bardeaux bitumineux
	Éléments associés à la toiture
	Éléments sous toiture
	Étanchéité de toiture terrasse
	Fenêtres de toit, lanternaux, verrières
2 - Parois verticales extérieures et Façades	Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich
	Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage
	Façades lourdes y compris poteaux
	Menuiseries extérieures
	Éléments associés aux façades
3 - Parois verticales intérieures	Murs et cloisons maçonnés
	Poteaux
	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)
	Gaines et coffres verticaux
	Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres
4 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds
	Poutres et charpentes
	Poutres et charpentes
	Gaines et coffres horizontaux
	Faux plafonds
	Suspentes et contrevents
5 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sols
6 - Conduits et accessoires intérieurs	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)
	Clapets / volets coupe-feu
	Vide-ordures
7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques	Portes et cloisons palières
	parois des équipements
	Matériels en machinerie
8 - Équipements divers et accessoires	Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes
	Convecteurs et radiateurs électriques
	fusibles à broche
	canalisations électriques préfabriquées
	Coffres-forts
	Portes de placard, baignoires et éviers métalliques
	Jardinières, bac à sable incendie
9 - Fondations et soubassements	Étanchéité des murs enterrés
	Parois verticales et horizontales enterrées
	Conduits et fourreaux
10 - Aménagements, voiries et réseaux divers	Conduits, Siphons
	Voiries
	Espaces sportifs
	Aménagements extérieurs

3.2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas échéant)

En plus du programme de repérage réglementaire, le présent rapport porte sur les parties de composants suivantes :

Composant de la construction	Partie du composant ayant été inspecté (Description)	Sur demande ou sur information
Néant	-	

3.2.6 *Le périmètre de repérage*

Descriptif des travaux :

Rénovation de la sous-station ECS

Descriptif des pièces visitées

S-1 - Sous-station,

Localisation	Description
S-1 - Sous-station	Sol Substrat : Béton Plafond Substrat : Isolant Porte 1 A Substrat : Bois Revêtement : Peinture Porte 2 F Substrat : Métal Revêtement : Peinture Conduits Substrat : Métal Revêtement : Peinture Mur A, B, C, D, E, F, G, H Substrat : Béton Revêtement : Peinture

4. – Conditions de réalisation du repérage

4.1 Bilan de l'analyse documentaire

Documents demandés	Documents remis
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés	Demandé, non communiqué
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place	Demandé, non communiqué
Eléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité	Demandé, non communiqué

Observations :
Néant

4.2 Date d'exécution des visites du repérage in situ

Date de la commande : 28/01/2025
Date(s) de visite de l'ensemble des locaux : 05/02/2025
Heure d'arrivée :
Durée du repérage :
Personne en charge d'accompagner l'opérateur de repérage : Sans accompagnateur

4.3 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur

La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, révision d'Août 2017.

Observations	Oui	Non	Sans Objet
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site	-	-	X
Vide sanitaire accessible			X
Combles ou toiture accessibles et visitables			X

4.4 Plan et procédures de prélèvements

L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention.

4.5 Réserves

Le repérage amiante a pour objet de repérer, d'identifier et localiser les matériaux contenant de l'amiante. La mise en œuvre, l'épaisseur, ... ne font pas partie de la mission intégrante du repérage amiante et doivent faire l'objet d'une investigation complémentaire des entreprises intervenantes.

5. – Conclusion détaillé du repérage

5.1 Liste des produits et matériaux, présentée par catégorie

Dans le cadre de la mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

3 - Parois verticales intérieures

ZPSO-002 : Partie à inspecter : Enduit à base de ciment lissé ou taloché | Description : Enduit mur.					
Niveau : S-1					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Sous-station	1	Identifiant : ZPSO-002 Description : Enduit mur Quantification : 20 m2 Résultat : Présence d'amiante	Oui S-1 - Sous-station	002	

4 - Plafonds et faux plafonds

ZPSO-003 : Partie à inspecter : Panneaux et plaques | Description : Isolant plafond.					
Niveau : S-1					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Sous-station	1	Identifiant : ZPSO-003 Description : Isolant plafond Résultat : Absence d'amiante	Oui S-1 - Sous-station	003	

5 - Planchers et planchers techniques

ZPSO-001 : Partie à inspecter : Ragréage | Description : Ragréage.					
Niveau : S-1					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**

Sous-station	1	Identifiant : ZPSO-001 Description : Ragréage Résultat : Absence d'amiante	Oui S-1 - Sous-station	001	

ZPSO-007 : Partie à inspecter : Joint de dilatation et d'assemblage | Description : Joint de dilatation.

Niveau : S-1

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Sous-station	1	Identifiant : ZPSO-007 Description : Joint de dilatation Résultat : Absence d'amiante	Oui S-1 - Sous-station	007	

6 - Conduits et accessoires intérieurs

ZPSO-004 : Partie à inspecter : Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...) | Description : Calorifuge.

Niveau : S-1

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Sous-station	1	Identifiant : ZPSO-004 Description : Calorifuge Résultat : Absence d'amiante	Oui S-1 - Sous-station	004	

ZPSO-005 : Partie à inspecter : Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...) | Description : Calorifuge.

Niveau : S-1

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Sous-station	1	Identifiant : ZPSO-005 Description : Calorifuge Résultat : Absence d'amiante	Oui S-1 - Sous-station	005	

ZPSO-008 : Partie à inspecter : Joint entre éléments | Description : Joint tresse.					
Niveau : S-1					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Sous-station	1	Identifiant : ZPSO-008 Description : Joint tresse Résultat : Absence d'amiante	Oui S-1 - Sous-station	008	

ZPSO-009 : Partie à inspecter : Joint plat prédécoupé pour brides | Description : Joint de bride.					
Niveau : S-1					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Sous-station	1	Identifiant : ZPSO-009 Description : Joint de bride Quantification : 5 U Résultat : Présence d'amiante	Oui S-1 - Sous-station	009	


ZPSO-010 : Partie à inspecter : Joint plat prédécoupé pour brides | Description : Joint de bride.					
Niveau : S-1					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Sous-station	1	Identifiant : ZPSO-010 Description : Joint de bride Quantification : 5 U Résultat : Présence d'amiante	Oui S-1 - Sous-station	010	



8 - Équipements divers et accessoires

ZPSO-006 : Partie à inspecter : Calorifugeage | Description : Calorifugeage.					
Niveau : S-1					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**

Sous-station	1	Identifiant : ZPSO-006 Description : Calorifugeage Résultat : Absence d'amiante	Oui S-1 - Sous-station	006	

5.2 Récapitulatif zone par zone

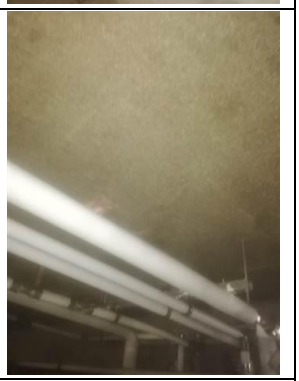Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
ZPSO-001	Localisation : S-1 - Sous-station Zone : Continue Echantillons : 001 Description : Ragréage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-002	Localisation : S-1 - Sous-station Zone : Continue Echantillons : 002 Description : Enduit mur	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-003	Localisation : S-1 - Sous-station Zone : Continue Echantillons : 003 Description : Isolant plafond	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-004	Localisation : S-1 - Sous-station Echantillons : 004 Description : Calorifuge	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

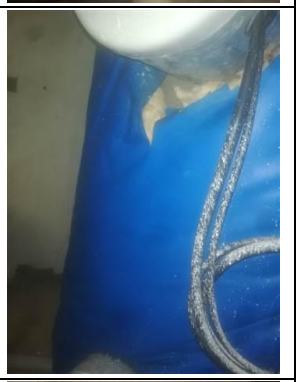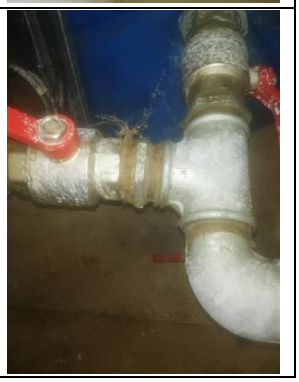Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
ZPSO-005	Localisation : S-1 - Sous-station Zone : Continue Echantillons : 005 Description : Calorifuge	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-006	Localisation : S-1 - Sous-station Zone : Continue Echantillons : 006 Description : Calorifugeage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-007	Localisation : S-1 - Sous-station Zone : Continue Echantillons : 007 Description : Joint de dilatation	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-008	Localisation : S-1 - Sous-station Zone : Discontinue Echantillons : 008 Description : Joint tresse	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
ZPSO-009	Localisation : S-1 - Sous-station Zone : Discontinue Echantillons : 009 Description : Joint de bride	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-010	Localisation : S-1 - Sous-station Zone : Discontinue Echantillons : 010 Description : Joint de bride	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

6. – Signatures


*Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par **SOCOTEC Certification France - 11-13 Cours Valmy Tour Pacific 92977 PARIS LA DEFENSE CEDEX (détail sur www.info-certif.fr)***

Fait à **Soisy sous Montmorency**, le **11/02/2025**

Par : DJIAN Michael



Cachet de l'entreprise



ANNEXES

Au rapport de mission de repérage n° RAAT_0103500001_LA GARENNE COLOMBES

Informations conformes à l'annexe III de l'arrêté du 12 décembre 2012

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est à l'origine de cancers (mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires) et d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques pleurales).

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à l'amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention du risque d'exposition à l'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante afin de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation.

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés, notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes.

Renseignez-vous auprès de votre mairie ou de votre préfecture. Pour connaître les centres d'élimination près de chez vous, consultez la base de données « déchets » gérée par l'ADEME, directement accessible sur le site internet www.sinoe.org.

Sommaire des annexes

7 Annexes

7.1 Schéma de repérage

7.2 Rapports d'essais

7.3 Conséquences réglementaires et recommandations

7.4 Recommandations générales de sécurité

7.5 Documents annexés au présent rapport

7.1 - Annexe - Schéma de repérage

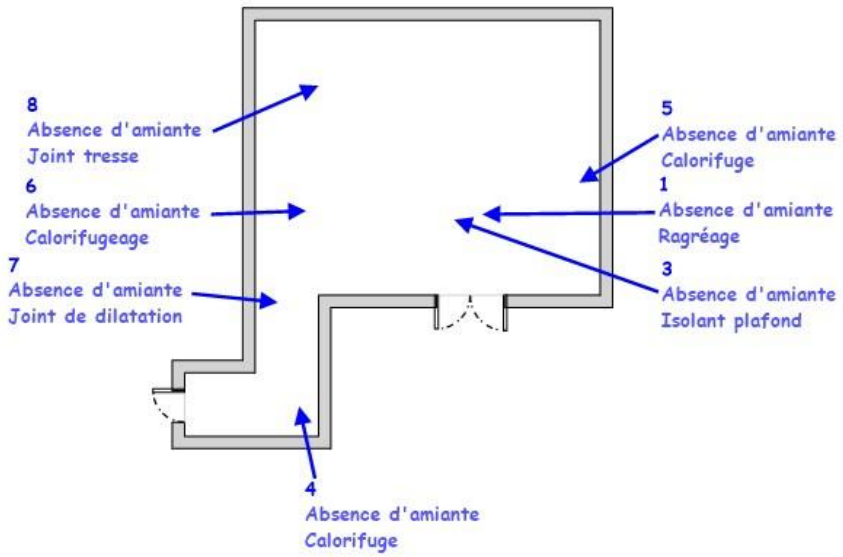


Planche (croquis) de repérage technique effectué par le cabinet : PYRAMIDE CONSEILS, auteur : DJIAN Michael
Dossier n° RAAT_0103500001_LA GARENNE COLOMBES du 05/02/2025
Adresse du bien : Résidence Les Champs Phillipe
15-17 Avenue de Verdun (Non communiqué) 92250 LA GARENNE COLOMBES

Présence d'amiante

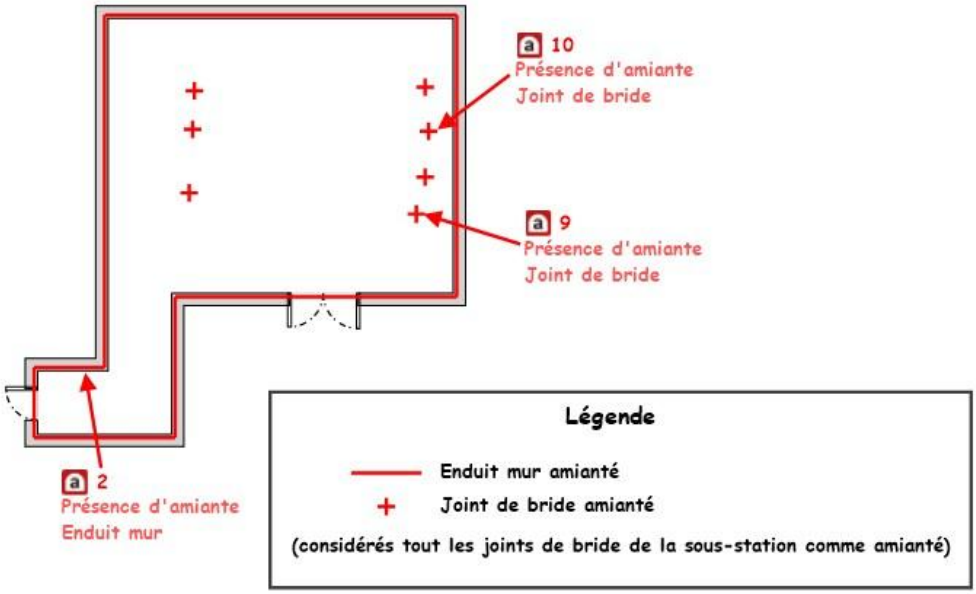





Planche (croquis) de repérage technique effectué par le cabinet : PYRAMIDE CONSEILS, auteur : DJIAN Michael
Dossier n° RAAT_0103500001_LA GARENNE COLOMBES du 05/02/2025
Adresse du bien : Résidence Les Champs Phillipe
15-17 Avenue de Verdun (Non communiqué) 92250 LA GARENNE COLOMBES

7.2 - Annexe - Rapports d'essais

Identification des échantillons prélevés :

Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
ZPSO-001-001	S-1 - Sous-station	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Ragréage	Ragréage **Analyse à réaliser:** 1 couche	
ZPSO-002-002	S-1 - Sous-station	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit mur **Analyse à réaliser:** 1 couche	
ZPSO-003-003	S-1 - Sous-station	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds	Panneaux et plaques	Isolant plafond **Analyse à réaliser:** 1 couche	
ZPSO-004-004	S-1 - Sous-station	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Calorifuge (tresses, coquilles, matelas…)	Calorifuge **Analyse à réaliser:** 1 couche	
ZPSO-005-005	S-1 - Sous-station	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Calorifuge (tresses, coquilles, matelas…)	Calorifuge **Analyse à réaliser:** 1 couche	

Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
ZPSO-006-006	S-1 - Sous-station	8 - Équipements divers et accessoires - Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes	Calorifugeage	Calorifugeage **Analyse à réaliser:** 1 couche	
ZPSO-007-007	S-1 - Sous-station	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Joint de dilatation et d'assemblage	Joint de dilatation **Analyse à réaliser:** 1 couche	
ZPSO-008-008	S-1 - Sous-station	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Joint entre éléments	Joint tresse **Analyse à réaliser:** 1 couche	
ZPSO-009-009	S-1 - Sous-station	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Joint plat prédécoupé pour brides	Joint de bride **Analyse à réaliser:** 1 couche	
ZPSO-010-010	S-1 - Sous-station	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Joint plat prédécoupé pour brides	Joint de bride **Analyse à réaliser:** 1 couche	

Copie des rapports d'essais :

LAB EXPERT

cofrac Accréditation N° 1-6752 Portée disponible sur www.cofrac.fr ESSAIS

Dossier DJIAN-HDSH-CHAUFFERIE
Prélèvement du : 05/02/2024
PROPRIÉTAIRE : Haut de Seine Habitat

La Garenne Colombes

PYRAMIDE CONSEILS
1 Rue Louis Armand
95230 SOISY SOUS MONTMORENCY

Rapport d'essai n°: R 00220125

A l'attention de Michael DJIAN
Ivry sur Seine, le 10/02/2025

Affaire n°: AF00146225 Date de réception : 05/02/2025 - Date de fin d'analyse : 10/02/2025

Recherche d'amiante dans les matériaux et/ou produits - R 00220125

Page 1/3

Arrêté du 1er octobre 2019 modifié par l'arrêté du 26 décembre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et accréditation des organismes procédant à ces analyses.

Nombre total d'échantillon(s) : 10

Ref. / Description client / Couche(s) à analyser	N° Ech. *Date analyse*	Description laboratoire (couches analysées)	Préparation		Analyse		Résultats	COFRAC
			Technique *Traitement*	Nb	Technique *analyste*	Nb		
1 Ragréage Chaufferie	EC 01346625 *10/02/2025*	Ragréage (Dur/Effritable,Gris) ; Colle (Traces) (Souple,Jaune) *Techniquement indissociable, contamination inter couches.*	META 1 *Chimique, Thermique, Ultra-Sons*	1	META *VS-VS*	2	Fibre d'Amiante Non Détecté	*
2 Enduit mur Chaufferie	EC 01346725 *10/02/2025*	Béton (Dur/Effritable,Gris) ; Enduit (Traces) (Dur/Effritable,Blanc) ; Peinture (Dur/Effritable,Gris) *Techniquement indissociable, contamination inter couches.*	META 1 *Chimique, Thermique, Ultra-Sons*	1	META *VS-VS*	2	Fibre d'Amiante Détecté Chrysotile	*
3 Isolant plafond Chaufferie	EC 01346825 *10/02/2025*	Laine minérale (Fibreux,Rose)	MOLP	2	MOLP *LL*	2	Fibre d'Amiante Non Détecté	*
		Laine minérale (Fibreux,Rose) ; Matériau (Effrit./Souple,Beige/Blc/Gris) ; Matériau (Traces) (Dur/Effritable,Gris) *Techniquement indissociable, contamination inter couches.*	META 1 *Chimique, Thermique, Ultra-Sons*	1	META *VS-VS*	2	Fibre d'Amiante Non Détecté	
	Suite à la non détection d'amiante dans le matériau Laine minérale (Fibreux,Rose) par MOLP, une analyse complémentaire par META a été réalisée. D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 micromètres), ont été observées dans l'échantillon suite au traitement effectué par le laboratoire. Les caractéristiques morphologiques, la structure cristalline et la composition chimique ont permis de les différencier des fibres d'amiante.							

Recherche d'amiante dans les matériaux et/ou produits - R 00220125

LAB-EXPERT - AF00146225 - Dossier DJIAN-HDSH-CHAUFFERIE

Nombre total d'échantillon(s) : 10

Ref. / Description client / Couche(s) à analyser	N° Ech. / Date analyse	Description laboratoire (couches analysées)	Préparation		Analyse		Résultats	COFRAC
			Technique *Traitement*	Nb	Technique *analyste*	Nb		
4 Calorifuge Chaufferie	EC 01346925 *10/02/2025*	Laine minérale (Fibreux,Rose)	MOLP	2	MOLP *LL*	2	Fibre d'Amiante Non Détecté	*
		Laine minérale (Fibreux,Rose) ; Matériau (Traces) (Dur/Effritable,Gris) *Techniquement indissociable, contamination inter couches.*	META 1 *Chimique, Thermique, Ultra-Sons*	1	META *VS-VS*	2	Fibre d'Amiante Non Détecté	
	Suite à la non détection d'amiante dans le matériau Laine minérale (Fibreux,Rose) par MOLP, une analyse complémentaire par META a été réalisée. D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 micromètres), ont été observées dans l'échantillon suite au traitement effectué par le laboratoire. Les caractéristiques morphologiques, la structure cristalline et la composition chimique ont permis de les différencier des fibres d'amiante.							
5 Calorifuge Chaufferie	EC 01347025 *10/02/2025*	Laine minérale (Fibreux,Vert)	MOLP	2	MOLP *LL*	2	Fibre d'Amiante Non Détecté	*
		Laine minérale (Fibreux,Vert) ; Bande plâtre (Dur/Fibreux,Beige/Blanc) ; Peinture (Dur/Effritable,Blanc) ; Matériau (Traces) (Dur/Effritable,Gris) ; Matériau (Traces) (Dur/Effritable,Marron) *Techniquement indissociable, contamination inter couches.*	META 1 *Chimique, Thermique, Ultra-Sons*	1	META *VS-VS*	2	Fibre d'Amiante Non Détecté	
	Suite à la non détection d'amiante dans le matériau Laine minérale (Fibreux,Vert) par MOLP, une analyse complémentaire par META a été réalisée.							
6 Calorifuge Chaufferie	EC 01347125 *10/02/2025*	Laine minérale (Fibreux,Beige/Marron)	MOLP	2	MOLP *LL*	2	Fibre d'Amiante Non Détecté	*
		Laine minérale (Fibreux,Beige/Marron) ; Matériau (Traces) (Dur/Effritable,Gris) *Techniquement indissociable, contamination inter couches.*	META 1 *Chimique, Thermique, Ultra-Sons*	1	META *VS-VS*	2	Fibre d'Amiante Non Détecté	
	Suite à la non détection d'amiante dans le matériau Laine minérale (Fibreux,Beige/Marron) par MOLP, une analyse complémentaire par META a été réalisée. D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 micromètres), ont été observées dans l'échantillon suite au traitement effectué par le laboratoire. Les caractéristiques morphologiques, la structure cristalline et la composition chimique ont permis de les différencier des fibres d'amiante.							
7 Joint de dilatation Chaufferie	EC 01347225 *10/02/2025*	Joint (Souple,Noir) ; Matériau (Traces) (Dur/Effritable,Gris/Marron) *Techniquement indissociable, contamination inter couches.*	META 1 *Chimique, Thermique, Ultra-Sons*	1	META *VS-VS*	2	Fibre d'Amiante Non Détecté	*
8 Joint tresse Chaufferie	EC 01347325 *10/02/2025*	Matériau (Fibreux,Beige/Marron) ; Matériau (Souple,Gris) *Techniquement indissociable, contamination inter couches.*	META 1 *Chimique, Thermique, Ultra-Sons*	1	META *VS-VS*	2	Fibre d'Amiante Non Détecté	*
9 Joint bride Chaufferie	EC 01347425 *07/02/2025*	Joint (Dur/Fibreux,Gris) ; Matériau (Dur/Effritable,Brique) ; Matériau (Traces) (Dur/Effritable,Beige) *Techniquement indissociable, contamination inter couches.*	MOLP	2	MOLP *PC*	2	Fibre d'Amiante Détecté Chrysotile	*
10 Joint bride Chaufferie	EC 01347525 *07/02/2025*	Joint (Dur,Gris) ; Matériau (Dur/Effritable,Brique) ; Matériau (Traces) (Dur/Effritable,Beige) *Techniquement indissociable, contamination inter couches.*	MOLP	2	MOLP *PC*	2	Fibre d'Amiante Détecté Chrysotile	*

Recherche d'amiante dans les matériaux et/ou produits - R 00220125

LAB-EXPERT - AF00146225 - Dossier DJIAN-HDSH-CHAUFFERIE

Nombre total d'échantillon(s) : 10

Le présent rapport ne concerne que les échantillons cités ci-dessus considérés étant aptes à être préparés par le laboratoire et ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sa reproduction n'est alors autorisée que sous sa forme intégrale, sauf accord écrit du laboratoire. Seule l'édition originale du rapport portant la validation technique du laboratoire engage sa responsabilité. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation.
Elles sont identifiées par le symbole *. Toutes les informations fournies par le client (références du dossier et de l'échantillon, localisation, date et lieu de prélèvement, ou toute autre information relative à l'échantillon avant son dépôt) relèvent de sa seule responsabilité et ne sont pas couvertes par l'accréditation du laboratoire.
La limite de détection des fibres d'amiante garantie par le laboratoire, lors de l'analyse par META et par MOLP des matériaux est de 0,1% en masse dans 95% des cas et dans la limite de 4 couches indissociables conformément à la validation de méthode. Au-delà de 4 couches, le résultat d'analyse sera présenté hors champ d'accréditation et ne pourra donc pas être exploité dans un contexte règlementaire opposable.
La fibre d'amiante est identifiée et caractérisée par Microscopie Électronique à Transmission avec Analyseur (META) en fonction de sa morphologie (longueur minimale 0,5 µm), de sa structure cristalline et de sa composition chimique. Toute couche présentant un résultat en fibre d'amiante non détecté peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.
Toute couche analysée par MOLP (Microscopie Optique à Lumière Polarisée), présentant un résultat en fibre d'amiante non détecté peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.
Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 micromètres.
META 1 : Préparation matériaux et produits manufacturés pouvant contenir de l'amiante délibérément ajouté selon méthode interne de traitement (OPE-ESS-MO-001) / Analyse selon parties pertinentes des normes NF X 43-050 et NF ISO 22262-1.
META 2 : Préparation des matériaux et produits manufacturés pouvant contenir naturellement de l'amiante et/ou de l'amiante délibérément ajouté selon méthode interne de traitement (OPE-ESS-MO-005) / Analyse selon parties pertinentes de la norme NF X43-050 et IMA : Principes pétrographiques et de classification minéralogique (Hawthorne F. C. et al., (2012) et A.J. Locock (2014)).
META 3 : Préparation des poussières sur lingettes selon méthode interne de traitement (OPE-ESS-MO-004) / Analyse selon parties pertinentes des normes NF X43-050 et NF ISO 22262-1 hors champ d'accréditation et hors du cadre règlementaire indiqué.
META 4 : Préparation des matériaux bruts pouvant contenir naturellement de l'amiante selon méthode interne de traitement (OPE-ESS-MO-006) / Analyse selon parties pertinentes de la norme NF X43-050 et IMA : Principes pétrographiques et de classification minéralogique (Hawthorne F. C. et al., (2012) et A.J. Locock (2014)).
MOLP : Recherche d'amiante dans les matériaux et produits par MOLP (OPE-ESS-MO-003) ; Guide HSG 248 - Appendice 2.
META 0 : Méthode d'analyse de matériaux et produits par META selon parties pertinentes des normes NF X43-050 et NF ISO 22262-1 hors champ d'accréditation et hors du cadre règlementaire indiqué, avec une préparation adaptée à l'échantillon.

Signataire technique
Samir CHENNINE



7.3 - Annexe - Conséquences réglementaires et recommandations

Conservation et transmission de ce rapport (Article 11 de l'arrêté du 16 juillet 2019)

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante - parties privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

7.4 - Annexe - Recommandations générales de sécurité

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l'amiante. Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, à défaut, l'exploitant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation ainsi qu'aux situations particulières rencontrées.
Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations générales

a) Dangerosité de l'amiante
Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le début de l'exposition à l'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition à l'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition à l'amiante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants ou de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). Dans le cas d'empoussièrement important, habituellement d'origine professionnelle, l'amiante peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l'exposition à d'autres agents cancérogènes, comme la fumée du tabac.

b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation
L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère cancérogène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997.
En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.
Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique font l'objet d'une évaluation de l'état de conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés.
De façon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de l'amiante et de faire appel à des professionnels compétents dans de telles situations.
Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de l'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 à R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l'amiante doivent en particulier être certifiées dans les conditions prévues à l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire à partir du 1er juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur l'enveloppe extérieure des immeubles bâtis et à partir du 1er juillet 2014 pour les entreprises de génie civil.
Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (http://www.travailler-mieux.gouv.fr) et sur le site de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (http://www.inrs.fr).

3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par exemple :

- perçage d'un mur pour accrocher un tableau ;
- remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante ;
- travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, par exemple des interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante.

L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente.
Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation.
Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l'INRS à l'adresse suivante : www.amiante.inrs.fr. De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.

4. Gestion des déchets contenant de l'amiante

Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination.
Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement.
Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l'entreprise qui réalise les travaux.

a. Conditionnement des déchets
Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières. Ils sont ramassés au fur et à mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de

l'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement notamment ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses.
Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder à l'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitôt que possible, dès que le volume le justifie après décontamination de leurs emballages.

b. Apport en déchèterie
Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchèterie.
A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux déchets d'amiante.

c. Filières d'élimination des déchets
Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées.
Les déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets.
Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.

d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante
Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès :

- de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
- du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;
- de la mairie ;
- ou sur la base de données « déchets » gérée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement accessible sur internet à l'adresse suivante : www.sinoe.org.

e. Traçabilité
Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification).
Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité d'une filière d'élimination des déchets.
Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchèterie pour y déposer des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie.

7.6 - Annexe - Autres documents

Condorcet
YOU TRUST · WE CARE

Allianz

ATTESTATION D'ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

Nous soussignés, Cabinet CONDORCET, 13 rue Francis Davso – 13001 Marseille, attestons par la présente que la Société :

Société SN PYRAMIDE CONSEILS
1 rue louis armand
95230 SOISY SOUS MONTMORENCY
Siret n°842 113 110 00022

a souscrit auprès de la compagnie ALLIANZ IARD, 1 cours Michelet, CS 30051, 92076 Paris La Défense Cedex, un contrat d'assurances « Responsabilité civile professionnelle Diagnostiqueur Immobilier », sous le numéro N° 86517808 / 808109147.

ACTIVITES DECLAREES PAR L'ASSURE : **DIAGNOSTIC IMMOBILIER :**

Diagnostic Assainissement autonome et collectif
Evaluation Périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante (MPCA)
Diagnostic amiante avant travaux/démolition sans préconisation de travaux NF X46-020 (articles R4412-140 à R4412-142 du Code du travail – article R1334-27 CSP – arrêté du 26 juin 2013)
Diagnostic amiante avant-vente et avant location
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
Diagnostic de risque d'intoxication au plomb dans les peintures (DRIPP)
Diagnostic de l'état des installations de gaz uniquement dans le cadre du DDT
Diagnostic surface habitable Loi Boutin
Diagnostic sécurité piscine
Diagnostic termites
Dossier technique amiante (DTA)
Diagnostic état de l'installation intérieure de l'électricité des parties privatives et communes (DTT)
Diagnostic Etats des lieux locatifs
Diagnostic Exposition au plomb (CREP)
Diagnostic Loi Carrez
Diagnostic Millièmes de copropriété et tantième de charges de copropriété
Diagnostic Etat parasitaire (mérules, vrillettes, lyctus, champignons)
Certificat de norme d'habitabilité dans le cadre de l'obtention d'un prêt conventionné et/ou d'un prêt à taux zéro
Diagnostic recherche de plomb avant travaux /démolition (art R1334-12 et R1334-8 du CSP – Article R4412 du Code du travail)
Diagnostic Etat des risques et pollutions (ERP)
Contrôle visuel après travaux de désamiantage (Norme NFX 46-021)

La garantie du contrat porte exclusivement :

- **Sur les diagnostics et expertises immobiliers désignés ci-dessus,**
- **Et à condition qu'ils et elles soient réalisés par des personnes possédant toutes les certifications correspondantes exigées par la réglementation**

Période de validité : **du 01/10/2024 au 30/09/2025.**

L'attestation est valable sous réserve du paiement des cotisations

La Société ALLIANZ garantit l'Adhérent dans les termes et limites des conditions générales n° 41128-01-2013, des conventions spéciales n° 41323-01-2013 et des conditions particulières (feuillet d'adhésion 808109147), établies sur les bases des déclarations de l'adhérent. Les garanties sont subordonnées au paiement des cotisations d'assurances pour la période de la présente attestation.

Tél 09 72 36 90 00
13 rue Francis Davso **13001 Marseille**
contact@cabinetcondorcet.com · www.cabinetcondorcet.com
Service Réclamation : contact@cabinetcondorcet.com · 13 rue Francis Davso 13001 Marseille 09 72 36 90 00
SAS au capital de 50 000 €· RCS Marseille 494 253 982 · Immatriculation ORIAS 07 026 627 www.orias.fr · Sous le contrôle de l'ACPR
Autorité de contrôle Prudentiel et Résolution· 4 Pl de Budapest 75009 Paris

Condorcet
YOU TRUST · WE CARE

Allianz


TABLEAU DE GARANTIE

Responsabilité civile « Exploitation »	
Nature des dommages	**Montant des garanties**
Dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non :	9 000 000 € par sinistre
dont :	
- Dommages matériels et immatériels consécutifs :	1 500 000 € par sinistre
- Dommages immatériels non consécutifs :	150 000 € par année d'assurance
- Atteintes à l'environnement accidentelles (corporels, matériels et immatériels) :	750 000 € par année d'assurance
- Dommages aux bâtiments loués ou empruntés et à leur contenu	300 000 € par sinistre
Responsabilité civile « Professionnelle » (garantie par Assuré)	
Nature des dommages	**Montant des garanties**
Dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non :	300 000 € par sinistre avec un maximum de 600 000 € par année d'assurance
dont :	
- Destruction ou détérioration des documents et autres supports d'informations confiés à l'Assuré pour l'exécution des prestations, y compris les frais de reconstitution des informations :	30 000 € par sinistre
Défense – Recours	
Défense devant les juridictions civiles, commerciales ou administratives. Défense des intérêts civils devant les juridictions répressives :	Frais à la charge de l'Assureur, sauf dépassement du plafond de garantie en cause.
Recours (préjudices supérieurs à 150 €) :	15 000 € par sinistre

La présente attestation ne peut engager l'assureur en dehors des limites prévues par les clauses et conditions du contrat auxquelles elle se réfère.

Fait à Marseille, le 16 septembre 2024

POUR LE CABINET CONDORCET



Tél 09 72 36 90 00
13 rue Francis Davso **13001 Marseille**
contact@cabinetcondorcet.com · www.cabinetcondorcet.com
Service Réclamation : contact@cabinetcondorcet.com · 13 rue Francis Davso 13001 Marseille 09 72 36 90 00
SAS au capital de 50 000 €· RCS Marseille 494 253 982 · Immatriculation ORIAS 07 026 627 www.orias.fr · Sous le contrôle de l'ACPR
Autorité de contrôle Prudentiel et Résolution· 4 Pl de Budapest 75009 Paris

SOCOTEC

CERTIFICAT

N° DTI / 2103-002

Certifie par la présente que :

Michael DJIAN

a passé avec succès les examens relatifs à la certification de ses compétences

DOMAINE TECHNIQUE	INTITULE DU/DE(S) TYPE(S) DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE IMMOBILIER	DEBUT DE VALIDITE	FIN DE VALIDITE
AMIANTE	Missions de repérage des matériaux et produits des listes A et B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans les bâtiments autres que ceux relevant de la mention	08/03/2021	07/03/2026
AMIANTE - avec mention	Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans des immeubles de grande hauteur, dans des établissements recevant du public répondant aux catégories 1 à 4, dans des immeubles de travail hébergeant plus de 300 personnes ou dans des bâtiments industriels, missions de repérage des matériaux et produits de la liste C, les examens visuels à l'issue des travaux de retrait ou de confinement	08/03/2021	07/03/2026
CREP	Constat de risque d'exposition au plomb (CREP)	23/11/2022	22/11/2029
ELECTRICITE	Etat des installations intérieures d'électricité	26/06/2023	25/06/2030
GAZ	Etat des installations intérieures de gaz	26/06/2023	25/06/2030
TERMITES Métropole	Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment en métropole	30/11/2023	29/11/2030

qui ont été réalisés par Socotec Certification France conformément aux arrêtés compétences :

- Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification

Délivré le 30/11/2023

cofrac ACCREDITATION N° 4-0065 PORTEE DISPONIBLE SUR WWW.COFRAC.FR

Thomas Hennion, Directeur **opérationnel**

Ce certificat n'a qu'une valeur indicative. La validité réelle d'un certificat SOCOTEC Certification International est matérialisée par la présence dans l'annuaire des certifiés disponible sur le site internet de SOCOTEC Certification France à l'adresse : www.socotec-certification-international.fr
SOCOTEC Certification France - 13, cours Valmy 92977 PARIS LA DEFENSE– France – SAS au capital de 100 000€ - RCS Créteil 490 984 309 -www.socotec-certification-international.fr

Aucun autre document n'a été fourni ou n'est disponible
